

특수공시 사업 목록

(단위 : 억원)

분 야 별	사 업 명	총사업비	비고
일 반 공 공 행 정	◦ CCTV 통합관제센터 구축 사업	18	완료
문 화 및 관 광	◦ 하멜전시관 건립	32.42	완료
	◦ 손양원 목사 유적지 조성사업	130	추진중
	◦ 향일암 일출 명소화 사업	51	완료
환 경 보 호	◦ 농어촌지역 제2단계 상수도확충사업	73.46	추진중
	◦ 도원지구 우수저류시설 설치사업	126.6	추진중
	◦ 해양쓰레기 수거·처리사업	48.35	추진중
사 회 복 지	◦ 시립노인요양원 신축공사	26.18	추진중
보 건	◦ 여수시 보건소 이전 신축	75	완료
농 립 해 양 수 산	◦ 봉황산 자연휴양림 조성 보완사업	62	추진중
	◦ 수산물 종합센터 조성사업	290	추진중
수 도 로 교 및 통	◦ 국동 어항단지~신월로간 도로개설	163	추진중
	◦ 석창교차로사업	220	완료
	◦ 거문교(동도~서도~연도교)가설공사	456	추진중
국 토 역 개 및 발	◦ 돌산읍 소재지 종합정비사업	100	추진중
	◦ 연등천 하천환경 조성사업	27	추진중
	◦ 웅천택지개발사업	5,897	추진중

1 여수시 CCTV통합관제센터 구축

실 태	❖ 분야별로 운영되던 CCTV시설을 통합 연계하여 다양한 분야에 효율적인 운영을 통해 CCTV통합관제센터의 운영효과를 극대화
추진방향	❖ 각종 재난·재해 및 사건·사고 발생 시 신속하고 체계적인 대응 체계 확립
기대효과	❖ 신속한 대응체계 구축을 통한 사건·사고 해결 및 범죄 예방 효과

사업개요

- 위 치 : 여수시 학동 168번지, 364㎡/110평
- 사업기간 : 2011. 10. ~ 2012. 4.
- 사업규모 : CCTV통합관제센터 구축 및 관련 H/W, S/W 도입,
통합관제센터 내 인테리어, 부대장치 등 환경공사,
시 산하 및 초등학교 CCTV통합연계시스템 구축 등
- 사 업 비 : 18억 원(국비 8.7, 도비 2.2, 시비 5.3, 교육청 1.8)

<연도별 사업비 투자계획>


(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2009년 까지	2010년	2011년	2012년이후
계	18	-	-	4.5	13.5
국 비	8.7	-	-	4.5	4.2
도 비	2.2	-	-	-	2.2
시 비	5.3	-	-	-	5.3
기 타	1.8	-	-	-	1.8

사업진행 현황

- 2011. 1 : 2011년도 추진 지자체 선정(전국 34개)
- 2011. 10 : CCTV통합관제센터 구축사업 시행
- 2011. 11 : CCTV통합관제센터 구축사업 착수보고회
- 2012. 4 : CCTV통합관제센터 시험 운영 및 준공
- 2012. 5 : CCTV통합관제센터 정상 운영

조 감 도

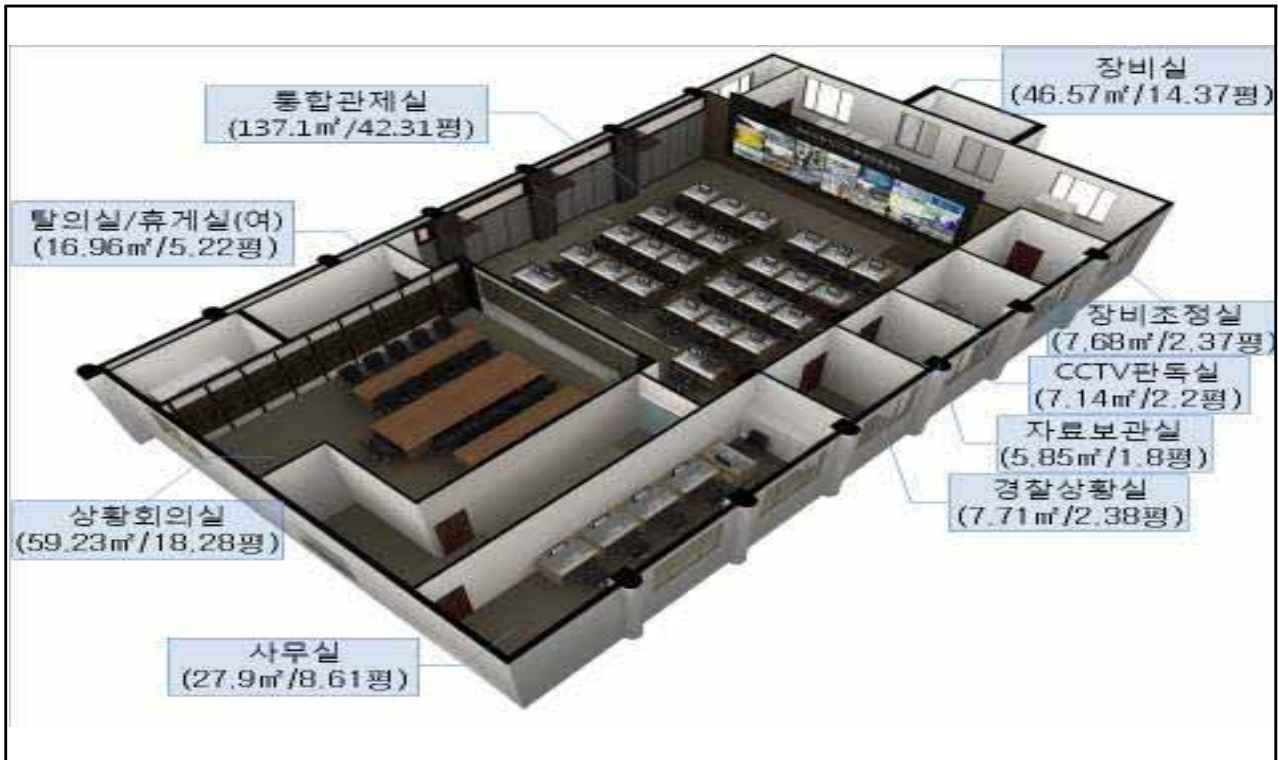

전경사진



2 하멜전시관 건립

실 태	❖ 하멜 일행이 여수에서 3년 7개월 동안 생활하고 종화동 해안가에서 최종 탈출하여 하멜표류기를 작성함으로써 350여년전 서양에 조선을 처음 소개함.
추진방향	❖ 하멜공원내 하멜전시관 건립, 하멜풍차 조성
기대효과	❖ 하멜 일행의 마지막 행적지와 자유를 향해 출발한 지점을 관광 아이템으로 부각시켜 문화관광자원으로 활용

사업 개요

- 위 치 : 여수시 하멜로 96(종화동 458-5)
- 사업기간 : 2012. 3. ~ 2012. 9.
- 사업규모 : 지상 2층, 660.37㎡, 풍차 설치
- 사 업 비 : 32.42억 원(국비 10, 시비 22.42)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2010년 까지	2011년	2012년	2013년이후
계	32.42	-	10	22.42	-
국 비	10	-	-	10	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	22.42	-	10	12.42	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

- 2011. 9 : 여수시의회 공유재산관리계획 의결
- 2011. 10 : 설계 및 전시물 제작설치 용역 제안 공모
- 2011. 12 : 기본 및 실시설계
- 2012. 3 : 공사 착공
- 2012. 9 : 전시관 건립, 풍차설치 완료
- 2012. 10 : 하멜전시관 개관

조감도



전경사진



3 손양원 목사 유적지 조성사업

실 태	❖ 손양원목사 순교지 관련 유무형의 종교관광 자원을 활용한 역사·문화·종교테마형 관광명소로 개발
추진방향	❖ 문화관광 성향의 변화에 따라 목적형 관광형태의 수용
기대효과	❖ 새로운 관광수요를 창출하여 관광객 유치증대 도모

사업 개요

- 위 치 : 여주시 읍촌면 신평리(유적지) 일원
- 사업기간 : 2009. 1. ~ 2015. 12.
- 사업규모 : 기념공원(84,580㎡), 진입도로(0.81km), 순교 기념관 리모델링(2층), 숙박시설(10동), 홍보관 및 체험관 등
- 사 업 비 : 130억 원(광특 60, 시비 70)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	130	100	-	30	-
국 비	60	45	-	15	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	70	55	-	15	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황


- 2010. 2. 18 : 둔덕동 순교지 공원조성
- 2012. 2. 2 : 순교기념관 리모델링(건축) 공사 준공
- 2012. 2. 10 : 유적지 진입도로 개설(0.81km) 공사 준공
- 2012. 5. 8 : 유적지 공원(84,580㎡) 조성사업 준공

※ 2013년 8월 현재 공정률 90%

조감도



위치도

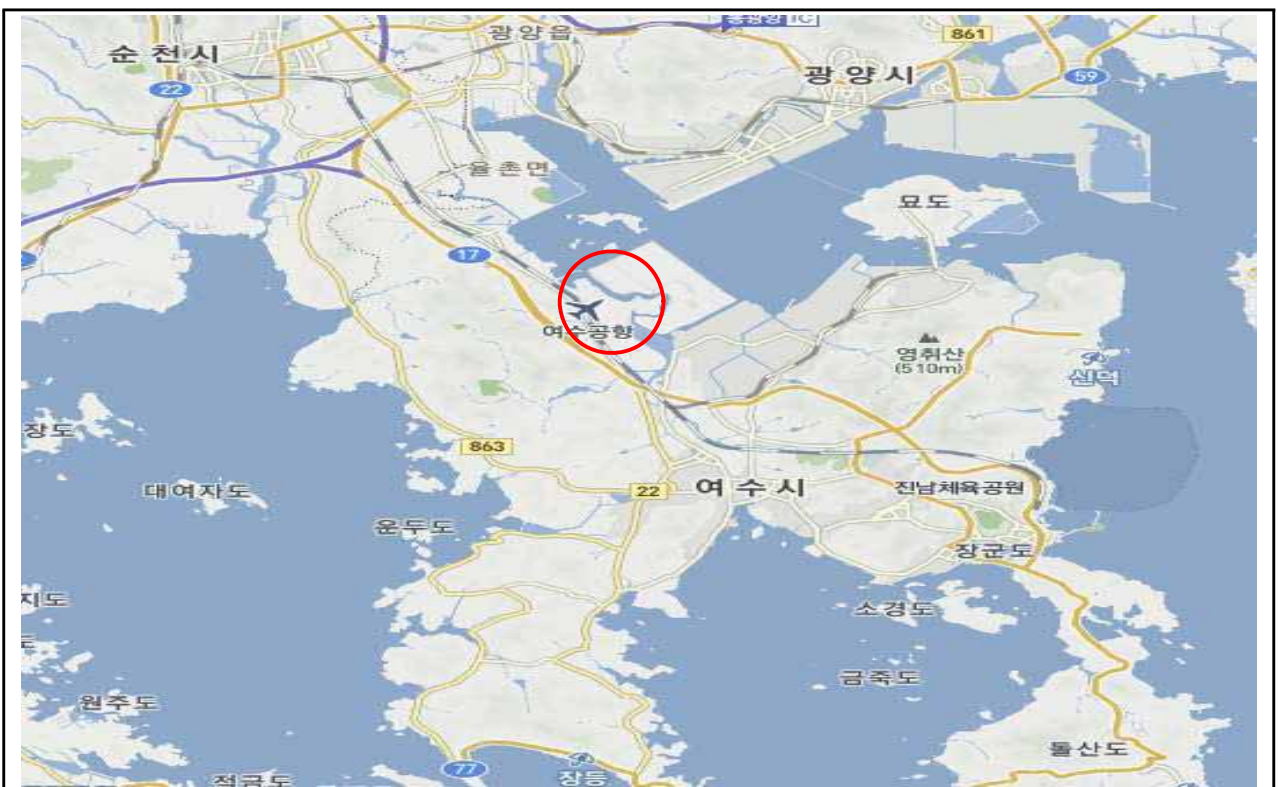

4 향일암 일출 명소화 사업

실 태	❖ 우리지역 해돋이 명소인 향일암 주변을 정비하여 관광객 유치 및 관광 상품 개발
추진방향	❖ 향일암을 찾는 관광객에 대한 관광 편의시설확충 및 주변 정비
기대효과	❖ 관광객 유치 등 지역경제 활성화 도모

사업 개요

- 위 치 : 여수시 돌산읍 율림리 9번지 일원
- 사업기간 : 2010 ~ 2012.
- 사업규모 : 일출광장 1,200㎡, 진입로 295m, 주차장 2,094㎡
- 사 업 비 : 51억 원(국비 20, 시비 31)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2009년 까지	2010년	2011년	2012년이후
계	51	-	10	16	25
국 비	20	-	5	5	10
도 비	-	-	-	-	-
시 비	31	-	5	11	15
기 타	-	-	-	-	-

- 주요시설 : 일출광장, 진입로 정비, 주차장 조성


사업진행 현황

- 2011. 2 : 일출광장 조성(1,200㎡)공사 준공
- 2012. 4 : 주차장 조성(2,094㎡)공사 착공
- 2012. 6 : 진입로 정비(295m)공사 준공
- 2012. 5 ~ 2012. 11 : 주차장 조성공사 일시중지
- 2013. 5 : 완료

조 감 도



공사중 전경사진

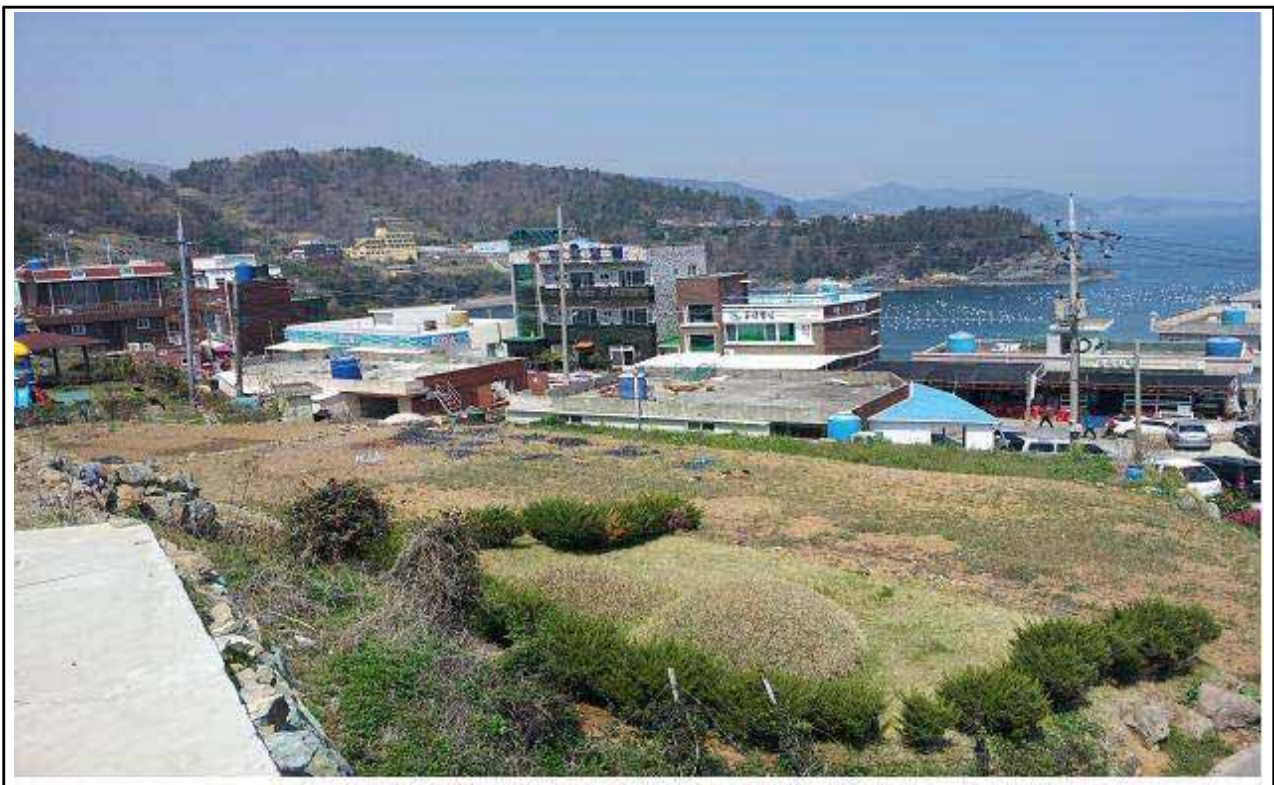

5 농어촌지역 제2단계 상수도 확충 사업

실 태	❖ 지하수 오염으로 수원고갈 및 수질불량에 따른 주민 식수난 해소 시급
추진방향	❖ 상수도 미공급지역에 상수도 시설 확충으로 안정적인 용수 공급
기대효과	❖ 주민생활 환경 개선과 도농지역간의 주민복리증진 및 지역균형발전 도모

사업 개요

- 위 치 : 돌산, 소라, 울촌면(7,972세대 21,495명)
- 사업기간 : 2012. 6. 18 ~ 2015. 6. 17
- 사업규모 : 관로 79km(돌산 27, 소라 24, 울촌 28)
- 사 업 비 : 73.46억 원(국 51.41, 도 2.63, 시 19.42)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년 까지	2013년	2014년	2015년이후
계	73.46	15.52	14.67	43.27	-
국 비	51.41	10.87	10.27	30.27	-
도 비	2.63	1.31	1.32	-	-
시 비	19.42	3.34	3.08	13	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

- 2012. 4. 2 : 실시설계 용역 착수
- 2013. 3. 28 : 실시설계 용역 완료
- 2013. 6. 14 : 총괄 및 1차분 계약체결
- 2013. 6. 18 : 1차분(L=16.8km) 착공
- 2013. 7 : 현장사무실 가설 및 노선측량(진도 5%)

※ 2013년 8월 현재 공정률 10%

조 감 도



6 도원지구 우수저류시설 설치사업

실 태	❖ 도원지구는 집중호우시 상습적인 침수피해를 입고 있어 거주 주민들의 재산과 통행차량의 침수등 재산상의 피해 발생
추진방향	❖ 집중호우시에 유입되는 우수를 저류하여 침수해소
기대효과	❖ 주택 및 상가 등 시가지 침수피해지역 주민의 숙원사업을 시행함으로써 지역주민의 생명 과 재산 보호

사업 개요

- 위 치 : 여수시 안산동 도원사거리 일원
- 사업기간 : 2012. 6. ~ 2014. 2.
- 사업규모 : 우수저류시설 11,400m³, 유입관로 L=352m 등
- 사 업 비 : 126.6억 원(국비 74 시비 52.6)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년	2013년이후
계	126.6	49.0	77.6
국 비	74.0	27.4	46.6
도 비	-	-	-
시 비	52.6	21.6	31.0
기 타	-	-	-

사업진행 현황

- 2012. 6 : 총괄공사 발주 및 1차분 공사 착공
- 2012. 9 : 도로굴착 심의 완료
- 2013. 4 : 1차분 준공 및 2차분 공사발주
- 2014. 2 : 준공예정

※ 2013년 8월 현재 공정률 55%

위치도



7 해양쓰레기 수거·처리사업

실 태	❖ 매년 어업활동 및 집중호우 등으로 해양쓰레기 대량발생
추진방향	❖ 매년 어업활동 및 집중호우 등으로 발생한 해양쓰레기의 신속한 수거·처리로 세계4대 미항여수 가꾸기 실천과 쾌적한 해양환경조성
기대효과	❖ 매년 발생하는 해양쓰레기 수거하여 깨끗한 해양환경조성

사업 개요

- 위 치 : 여수시 해안가 일원
- 사업기간 : 2009 ~ 2012.
- 사업규모 : 2,500톤/년
- 사 업 비 : 48.35억 원(국비 30.24, 도비 2.9, 시비 15.21)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2009년 까지	2010년	2011년	2012년이후
계	48.35	11.8	11.41	11.07	14.07
국 비	30.24	7.05	6.15	7.52	9.52
도 비	2.9	0.5	0.5	0.7	1.20
시 비	15.21	4.25	4.76	2.85	3.35
기 타	-	-	-	-	-

- 주요내용 : 도서지역 및 도심해안가 해양쓰레기 수거·처리 등

사업진행 현황

- 매년 1월 : 연간계획 수립 및 해안가 읍면동 사업비 교부 등
- 매년 1~12월 : 12개 읍·면·동과 연계하여 사업추진
- 매년 12월 : 사업 마무리 및 사업비 정산

※ 2013년 8월 현재 공정률 97%

해양쓰레기 발생장면



해안쓰레기 수거장면



8 시립노인요양원 신축공사

실 태	❖ 노인 장기요양원 보험제도 시행으로 시설입소 희망자는 급증하나 입소시설 부족으로 대기자가 발생하여 시설 확충을 위한 시립노인 요양원을 신축
추진방향	❖ 노인복지시설 확충
기대효과	❖ 전문적인 요양서비스 제공으로 안락한 노후생활 보장

사업 개요

- 위 치 : 여주시 소라면 복산리 792번지의외 1필지
- 사업기간 : 2012. 6. ~ 2013. 6.
- 사업규모 : 1동/지상4층/연면적 1,943㎡/철근콘크리트조
- 사 업 비 : 26.18억 원(국비 10.34, 도비 5.17, 시비 10.67)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2010년 까지	2011년	2012년	2013년이후
계	26.18	-	20.68	5.5	-
국 비	10.34	-	10.34	-	-
도 비	5.17	-	5.17	-	-
시 비	10.67	-	5.17	5.5	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

- 2010. 4 : 시설 신축사업 국·도비 보조사업 확정
- 2011. 5 : 수탁법인 선정(보문복지회)
- 2011. 9 : 예산편성(2,068백만원)
- 2012. 6 : 공사착공
- 2012. 9 : 부족예산 확보(550백만원)
- 2013. 6 : 공사준공

조감도



전경사진



9 여수시보건소 이전 신축

실 태	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 삼려통합전 10만여명의 인구가 이용하는 규모로 신축된 여천시 보건소를 통합이후 그대로 여수시 보건소로 사용 ❖ 건축한지 23년이 경과한 현 청사는 공간이 비좁고 협소하여 일일평균 5백여명의 공공 보건의료기관 방문 환자를 진료하는데 한계가 있음 ❖ 지역거점 공공보건 의료기관으로 시민의 건강 욕구를 해소하면서 보건의료수요에 능동적으로 대처하기 위하여 보건소 신축사업 추진
추진방향	❖ 공공보건의료기관 시설확충 및 예방과 건강 중심으로 보건정책 패러다임 변화로 보건의료서비스 기능강화
기대효과	❖ 쾌적한 의료서비스 공간제공 및 다양한 공공보건 프로그램 운영으로 시민건강 향상 도모

■ 사업 개요

- 위 치 : 여수시 시청서 4길 47(학동)
- 사업기간 : 2012. 2. 6. ~ 10. 30.
- 사업규모 : 연면적 4,101.83㎡ (2동 지하1층, 지상3층)
- 사 업 비 : 75억 원(국비 27.7, 도비 6.9, 시비 40.4)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2009년 까지	2010년	2011년	2012년이후
계	75	-	-	-	75
국 비	27.7	-	-	-	27.7
도 비	6.9	-	-	-	6.9
시 비	40.4	-	-	-	40.4
기 타	-	-	-	-	-

■ 사업진행 현황

- 2011. 10 : 여수시보건소신축공사 사업선정 및 사업비 교부결정
- 2012. 1 : 여수시보건소 신축공사 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2012. 2 : 여수시보건소 신축 기본설계 심의의뢰(보건복지부)
여수시보건소 신축공사 입찰공고 및 공사착공
- 2012. 6 : 여수시보건소 신축공사 에너지효율 1등급 예비인증 취득
- 2012. 10 : 공사준공 및 업무개시

조감도



공사 준공사진



10 봉황산 자연휴양림 조성 보완사업

실 태	❖ 봉황산 자연휴양림 구역은 사유지이며 구역내에 임도가 있어 휴양림 진입로 및 산책로 등 활용이 가능하고 개발 용이
추진방향	❖ 산림훼손을 최소화하고 자연경관을 고려하여 휴양림 조성
기대효과	❖ 남해안의 풍부한 관광자원과 연계한 산림휴양시설 확충으로 시민 및 관광객 편의 제공

사업 개요

- 위 치 : 여수시 돌산읍 신복리 산391번지 일원
- 사업기간 : 2009년 ~ 2013년
- 사업규모 : 숲속의 집 12동, 관리사무소 1동, 산림문화휴양관 1동, 화장실 1동, 야영장(야영테크 14개소), 편백 숲 산책로 1.5km 등
- 사 업 비 : 62억 원(국비 31, 도비 8.5, 시비 22.5)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2009년 까지	2010년	2011년	2012년이후
계	62	4.3	12.9	12.8	32
국 비	31	3.2	6.4	6.4	15
도 비	8.5	0.2	1.9	1.9	4.5
시 비	22.5	0.9	4.6	4.5	12.5
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

- 2009. 10 ~ 2010. 6 : 기본계획 및 실시설계용역 완료
- 2010. 6 ~ 2011. 3 : 휴양림 조성 1차공사(부지조성)
- 2011. 5 ~ 2012. 1 : 휴양림 조성 2차공사(건축)
- 2012. 5. 15 : 휴양림 개장
- 2012. 6 ~ 2012. 8 : 휴양림 보완공사(야영장, 산책로 설치 등)
- 2012. 12 ~ 2013. 5 : 산림문화휴양관 실시설계용역 완료
- 2013. 5 ~ 2013. 6 : 휴양림 진입도로 정비
- 2013. 6. 26 : 산림문화휴양관 신축사업 착공

※ 2013년 8월 현재 공정률 70%

조감도



전경사진



11 수산물 종합센터 조성사업

실 태	❖ 여수수협 위판장시설 노후화로 위생 및 미관저해
추진방향	❖ 국동 다기능어항과 연계한 현대화된 수산물종합센터 조성
기대효과	❖ 외지어선 위판 유치 및 관광명소화로 지역경제 활성화 도모

사업 개요

- 위 치 : 여수시 어항단지로 210(국동 어항단지 내)
- 사업기간 : 2010. 1. ~ 2013. 10. 31
- 사업규모 : 1개소 20,656㎡ (지하2층/ 지상4층)
- 사 업 비 : 290억 원(국비 145, 지방비 116, 기타 29)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2010년 까지	2011년까지	2012년	2013년이후
계	290	74	40	106	70
국 비	145	40	20	50	35
도 비	2	2		-	-
시 비	114	24	16	46	28
자 담	29	8	4	10	7

- 주요시설 : 활어·선어·건어위판장, 특산물 판매전시장, Sea Food Town (향토음식점), 사무실 등

사업진행 현황

- 2010. 9. 24 : 실시설계
- 2011. 1. 10 : 사업착공
- 2012. 4. 30 : 1단계 사업완료(건어물 판매장 및 사무실)
- 2012. 5. 1 : 2단계 사업착공(위판장, 주차장)
- 2013. 10. 31 : 사업준공 및 개장

※ 2013년 8월 현재 공정률 90%

조 감 도



공사중 전경사진



12 국동 어항단지~신월로간 도로개설

실 태	❖ 국동 어항단지와 연결되는 도로 미개설로 교통체증 발생 및 물류비 증가
추진방향	❖ 도심지 내 주요 간선도로망 확충으로 교통체증해소
기대효과	❖ 국동 다기능어항에 연결되는 도로개설로 어항 활성화

사업개요

- 위 치 : 여수시 국동 어항단지~신월로
- 사업기간 : 2000. 07. ~ 2015. 12
- 사업규모 : 도로개설 L=1.17km, B=25m
- 사 업 비 : 163억 원(시비)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2010년 까지	2011년	2012년	2013년이후
계	163	91	-	27	45
국 비	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	163	91	-	27	45
기 타	-	-	-	-	-


- 주요시설 : 차도, 보도, 가로등

사업진행 현황

- 2000. 7 : 실시설계완료
- 2003. 7 : 1차공사 완료
- 2011. 12 : 실시계획 변경인가
- 2012. 1 : 2차분 착공
- 2012. 12 : 3차분 착공

※ 2013년 8월 현재 공정률 70%

조 감 도

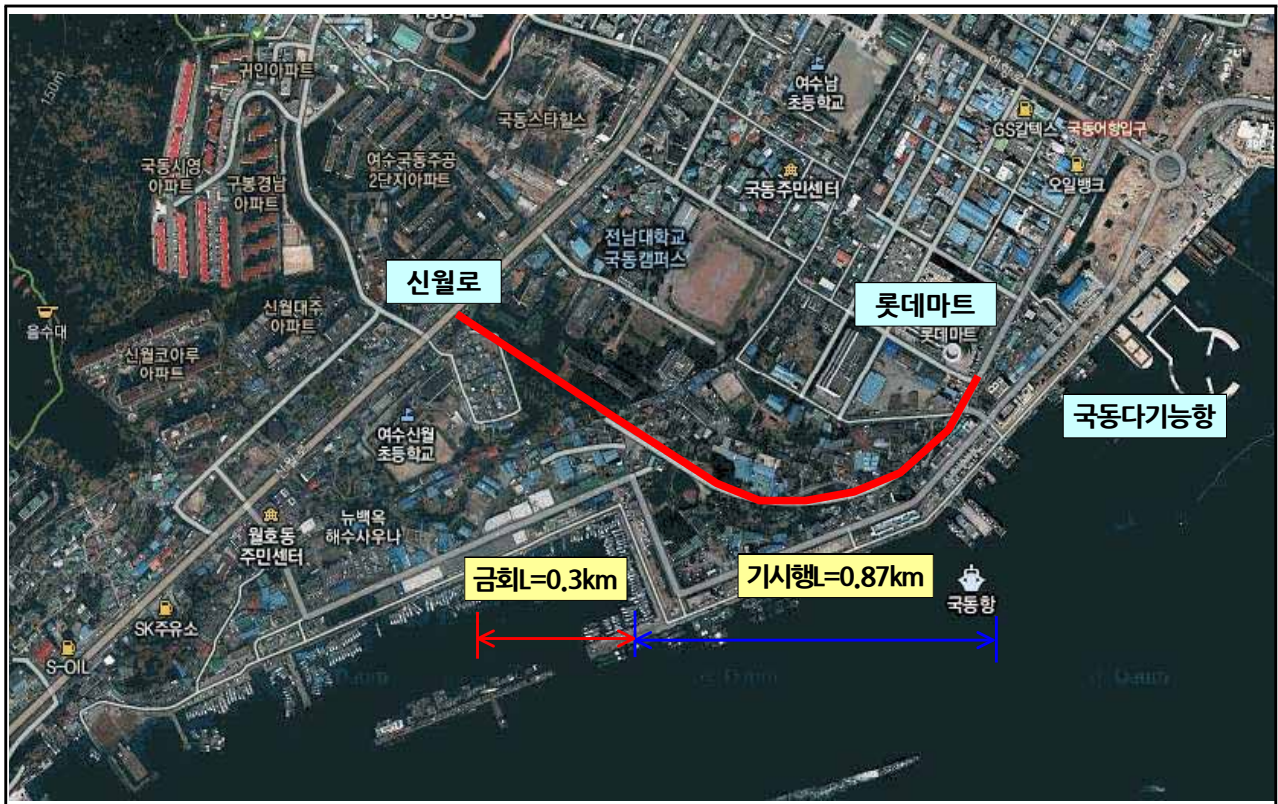

공사중 전경사진



13 석창교차로 개선사업

실 태	❖ 국가산업단지와 국도17호선이 교차하고 있어 극심한 정체 발생
추진방향	❖ 박람회장 주진입도로로 기능을 위해 입체교차화
기대효과	❖ 박람회장 진입차량과 국가산단 출퇴근 차량의 교통정체 해소

사업 개요

- 위 치 : 여수시 주삼동 석창교차로
- 사업기간 : 2011. 04. ~ 2012. 09
- 사업규모 : 교차로 개선(지하차도 1개소 등 L=620m)
- 사 업 비 : 220억 원(국비 170, 시비 50)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구	분	총사업비	2010년	2011년	2012년	2013년이후
계		220	5	95	120	-
국	비	170	-	60	110	-
도	비	-	-	-	-	-
시	비	50	5	35	10	-
기	타	-	-	-	-	-

- 주요시설 : 지하차도, 가로등

사업진행 현황

- 2010. 11 : 실시설계 용역 착수
- 2011. 4 : 공사착공
- 2012. 4 : 도로개통
- 2012. 9 : 공사준공

조 감 도



공사 전경사진



14 거문교(동도~서도 연도교) 가설공사

실 태	❖ 거문도권 3개 도서(거문, 동도, 서도) 주요 교통수단으로 선박을 이용하고 있는 실정으로 주민과 관광객의 불편
추진방향	❖ 해상교량 연결로 주민의 생활편의 제공과 관광자원 도모로 도서 지역의 균형발전 및 낙후지역 개발
기대효과	❖ 낙후 도서의 개발로 주민 정주의식 고취 및 ❖ 도서지역 탐방객의 교통편익제공과 낙후지역개발

사업 개요

- 위 치 : 여수시 삼산면 동도리~서도리
- 사업기간 : 2009 ~ 2014년
- 사업규모 : 도로개설 L=1.2km(교량 L=530m, 접속도로 L=670m)
- 사 업 비 : 456억 원(국비 319, 도비 68, 시비 69)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2009년	2010년	2011년	2012년이후
계	456	14	63	64	315
국 비	320	10	44	45	221
도 비	68	2	9	10	47
시 비	68	2	10	9	47
기 타	-	-	-	-	-

- 주요시설 : 해상교량(사장교) L=530m

사업진행 현황

- 2008. 1 : 제3차 도서종합개발사업 계획 반영 확정
- 2010. 12 : 공사계약(조달청)
- 2011. 1 : 공사착공
- 2012. 12 : 교량하부공사 100%, 보상 90% 완료
- 2013. 7 : 교량주탑공사 75%(전체 35%)

※ 2013년 8월 현재 공정률 38%

조 감 도



공사중 전경사진



15 돌산읍 소재지 종합정비사업

실 태	❖ 농촌지역의 문화, 복지, 교육 등의 다수주민이 이용 가능한 시설확충 필요
추진방향	❖ 읍소재지 생활편익, 복지시설 확충 등으로 주민들의 정주 서비스 제공
기대효과	❖ 사회기반시설 확충을 통한 정주여건 개선 및 지역경제 활성화

사업 개요

- 위 치 : 여수시 돌산읍 군내리 일원
- 사업기간 : 2011. 1. ~ 2014. 12.
- 사업규모 : 도로개설 L=1.2km B=8~10m, 쉼터 2개소, 체육시설 1개소
- 사 업 비 : 100억 원(국비 70, 시비 30)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구	분	총사업비	2011년	2012년	2013년	2014년이후
계		100	20	12.86	11.57	55.57
국	비	70	14	9	8.1	38.9
도	비	-	-	-	-	-
시	비	30	6	3.86	3.47	16.67
기	타	-	-	-	-	-

- 주요시설 : 도로개설, 쉼터, 체육시설

사업진행 현황

- 2010. 11 : 사업지구 확정(농림축산식품부)
- 2011. 12 : 기본계획수립 승인
- 2012. 3 : 기본계획 수립 및 실시설계 완료
- 2012. 7 : 편입토지 및 지장물건 보상협의 착수
- 2013. 4 : 공사 착공

※ 2013년 8월 현재 공정률 27%

조감도



공사중 전경사진



16 연등천 하천환경 조성사업

실 태	❖ 도심하천 연등천이 집중호우로 인한 반복적 침수피해 발생
추진방향	❖ 연등천 하천기본계획을 근거로 계획 홍수량에 맞춰 파라펫 등을 설치 충분한 하천단면을 확보 상습침수지역 침수예방
기대효과	❖ 하천단면 확보 및 석축 기초보강으로 연등천 주변 주민들의 홍수피해 감소 및 서시장 활성화로 지역경제에 기여

사업 개요

- 위 치 : 여수시 연등천 하류부 (범민교 ~ 남산교)
- 사업기간 : 2012. 1. ~ 2016. 6.
- 사업규모 : 하천정비 L=780m(호안보강, 파라펫설치, 하상준설 등)
- 사 업 비 : 27억 원(국비 16, 시비 11)

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2012년까지	2013년	2014년	2015년이후
계	27	5	22	-	-
국 비	16	3	13	-	-
도 비	-	-	-	-	-
시 비	11	2	9	-	-
기 타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

- 2012. 2 : 연등천 하천환경조성사업 실시설계용역(기본계획 포함) 착수
- 2012. 5 : '12년도 하천환경조성사업(준설) 완료(524m, 6,243m³)
- 2013. 1 : 연등천 하천기본계획 확정 고시(전남지사2013-11호)
- 2013. 3 : 연등천 하류부 실시설계 완료
- 2013. 7 : 연등천 하천기본계획 변경 및 총사업비 조정 협의
 - 기본계획 변경 : 전라남도 방재과와 협의
 - 총사업비 변경 : 전남도, 익산청, 국토부와 협의
(2,735억 ⇒ 91억 국토부 변경절차 추진)
- 2013. 7 : 하천기본계획 변경 주민의견 청취
- 2013. 8 : 전남도 기본계획 변경 수립 및 국토부 총사업비 변경 승인
- 2013. 10 : 사업착공(예정)
- 2016. 6 : 사업준공(예정)

위치도



전경사진



17 웅천택지개발사업

실 태	❖ 1단계는 공사 준공하였고, 2~3단계는 보상을 완료하고 현재 공정률 82%로 원활히 추진중임
추진방향	❖ 인간과 자연이 공존하는 친환경적 신도심 조성
기대효과	❖ 지역 주민의 개발욕구 충족 및 품격 높은 택지 공급

사업 개요

- 위 치 : 여수시 웅천동 일원
- 사업기간 : '04. 4. 27. ~ '13. 9. 30.
- 사업규모 : 2,800천㎡(1단계 717, 2단계 1,215, 3단계 868)
- 사 업 비 : 5,897억 원

<연도별 사업비 투자계획>

(단위 : 억원)

구	분	총사업비	2011년까지	2012년	2013년	2014년이후
계		5,897	4,392	1,068	437	-
국	비	-	-	-	-	-
도	비	-	-	-	-	-
시	비	5,897	4,392	1,068	437	-
기	타	-	-	-	-	-

사업진행 현황

- 2004. 2 : 웅천지구 택지조성사업 실시계획 변경 승인
- 2004. 4 : 공사착공(1단계)
- 2008. 12 : 공사착공(3단계)
- 2009. 12 : 웅천지구 택지조성사업 실시계획 변경 승인
- 2010. 6 : 공사준공(1단계)
- 2011. 4 : 공사착공(2단계)

※ 2013년 8월 현재 공정률 82%

계 획 도



조 감 도

